

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE OBRA

CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI						
ENDEREÇO:	RUA MARCOS VIEIRA – 1621 - CENTRO – BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI						
DATA:	20/05/2026	PRAZO					
PERCENTUAL EXECUTADO:	54,40%	INICIAL	ADITIVO	DATA INÍCIO	DECORRIDO	DATA TÉRMINIO	SALDO
		453	0	04/10/2025	228	31/12/2026	225

OBSERVAÇÕES GERAIS

NORMA GERAL DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR 123/2006
PROCEDIMENTO N°. 001/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

CONTRATADA:
JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE
CNPJ SOB O N°. 31.675.494/0001-38
ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 77 - SALA A - CENTRO – SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI

VALOR DE CONTRATO: R\$ 1.397.548,05 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS)

ASSINATURA CONTRATO: 03/10/2025

INICIO DA EXECUÇÃO: 10/11/2025

FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 31/12/2026

FISCALIZAÇÃO:

DATA DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: 20/05/2026


RESUMO DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: [EM ANDAMENTO](#)

FISCAL DE CONTRATO:
ONEIDE DA SILVA AGUIAR, PORTADOR DO CPF N°. 634.531.901-00

TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE – ME
CNPJ: 31.675.494/0001-38 | Insc. Estadual: 196294401

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
2	REFORMA CAMARA DOS VEREADORES	-	-	100,00%	0,00%

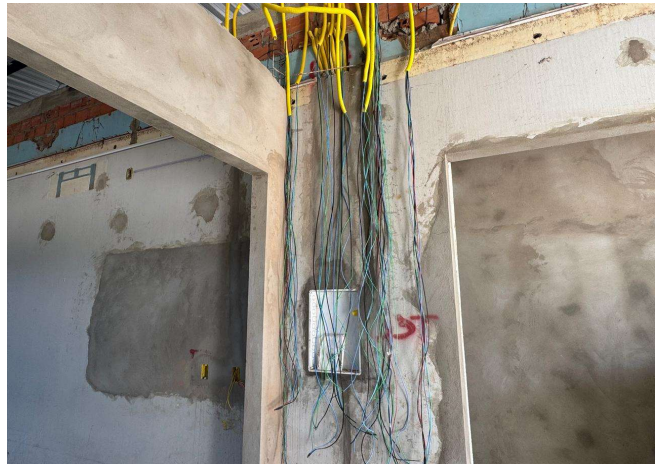


OBSERVAÇÕES GERAIS

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

TR EMPREENDIMENTOS

JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE – ME
CNPJ: 31.675.494/0001-38 | Insc. Estadual: 196294401

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
3	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI	-		-	-

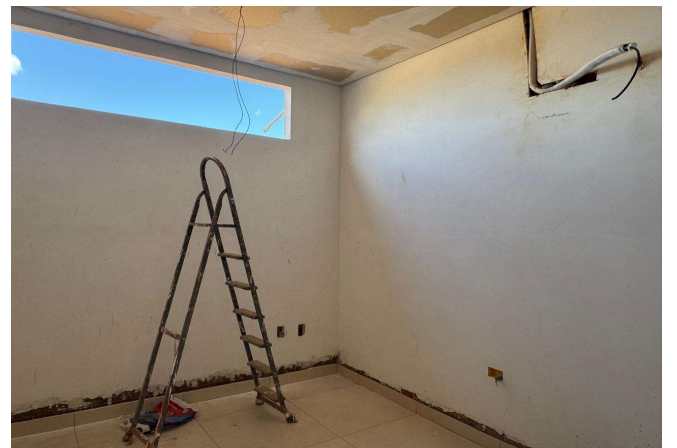

OBSERVAÇÕES GERAIS

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
