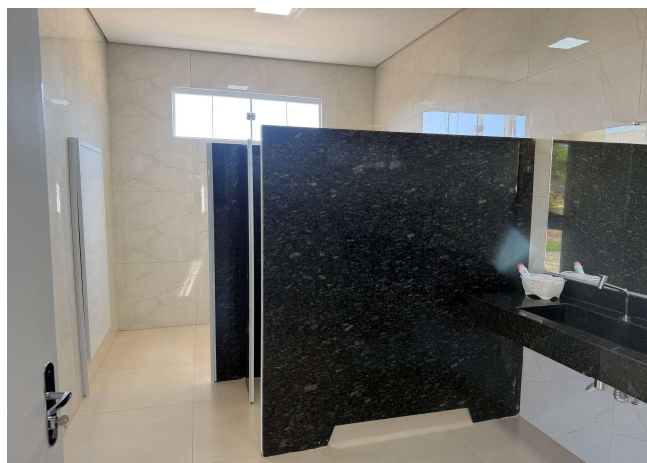
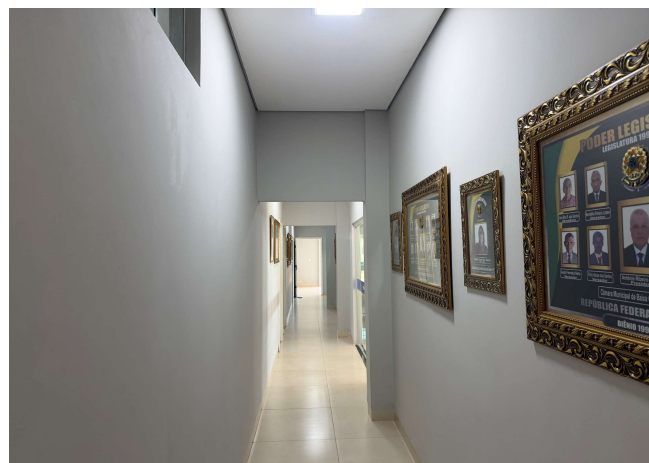




CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI						
ENDEREÇO:	RUA MARCOS VIEIRA – 1621 - CENTRO – BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI						
DATA:	20/08/2026	PRAZO					
PERCENTUAL EXECUTADO:	75,06%	INICIAL	ADITIVO	DATA INÍCIO	DECORRIDO	DATA TÉRMINIO	SALDO
		453	0	04/10/2025	320	31/12/2026	133
OBSERVAÇÕES GERAIS							
NORMA GERAL DA LEI FEDERAL DE LICITAÇÕES 14.133/2021, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 PROCEDIMENTO N°. 001/2025 MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA CONTRATADA: JOÃO TADEU PEREIRA ROQUE CNPJ SOB O N°. 31.675.494/0001-38 ENDEREÇO: RUA SANTA RITA, 77 - SALA A - CENTRO – SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO/PI VALOR DE CONTRATO: R\$ 1.397.548,05 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS) ASSINATURA CONTRATO: 03/10/2025 INICIO DA EXECUÇÃO: 10/11/2025 FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 31/12/2026 FISCALIZAÇÃO: DATA DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: 20/08/2026 RESUMO DA FISCALIZAÇÃO ATUAL: EM ANDAMENTO FISCAL DE CONTRATO: ONEIDE DA SILVA AGUIAR, PORTADOR DO CPF N°. 634.531.901-00							

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
2	REFORMA CAMARA DOS VEREADORES	-	-	100,00%	0,00%

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI

COD	DESCRIÇÃO	UND	TOTAL	EXECUTADO	SALDO
3	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI	-		-	-

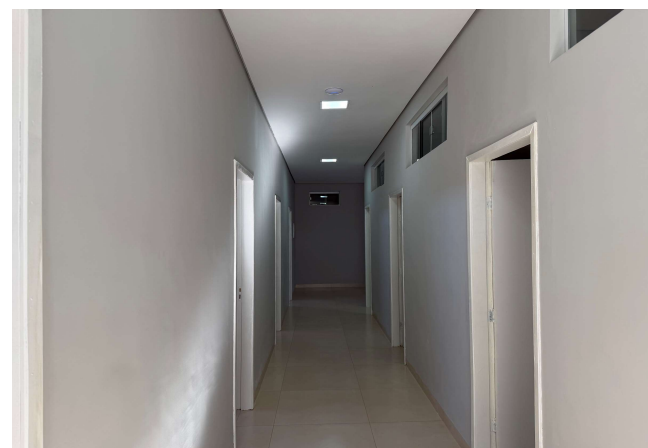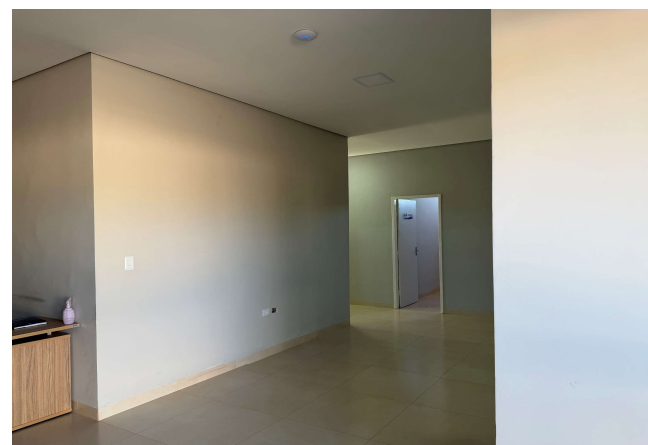

OBSERVAÇÕES GERAIS

AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI
